


Datum	25.07.14
Bearb.	Hattinger
Gep.	
Norm	



Control CUE 1-DL18,5kW  
Aktivpark Montafon  
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
	249/14
	Blatt 1
	von 5 Bl.



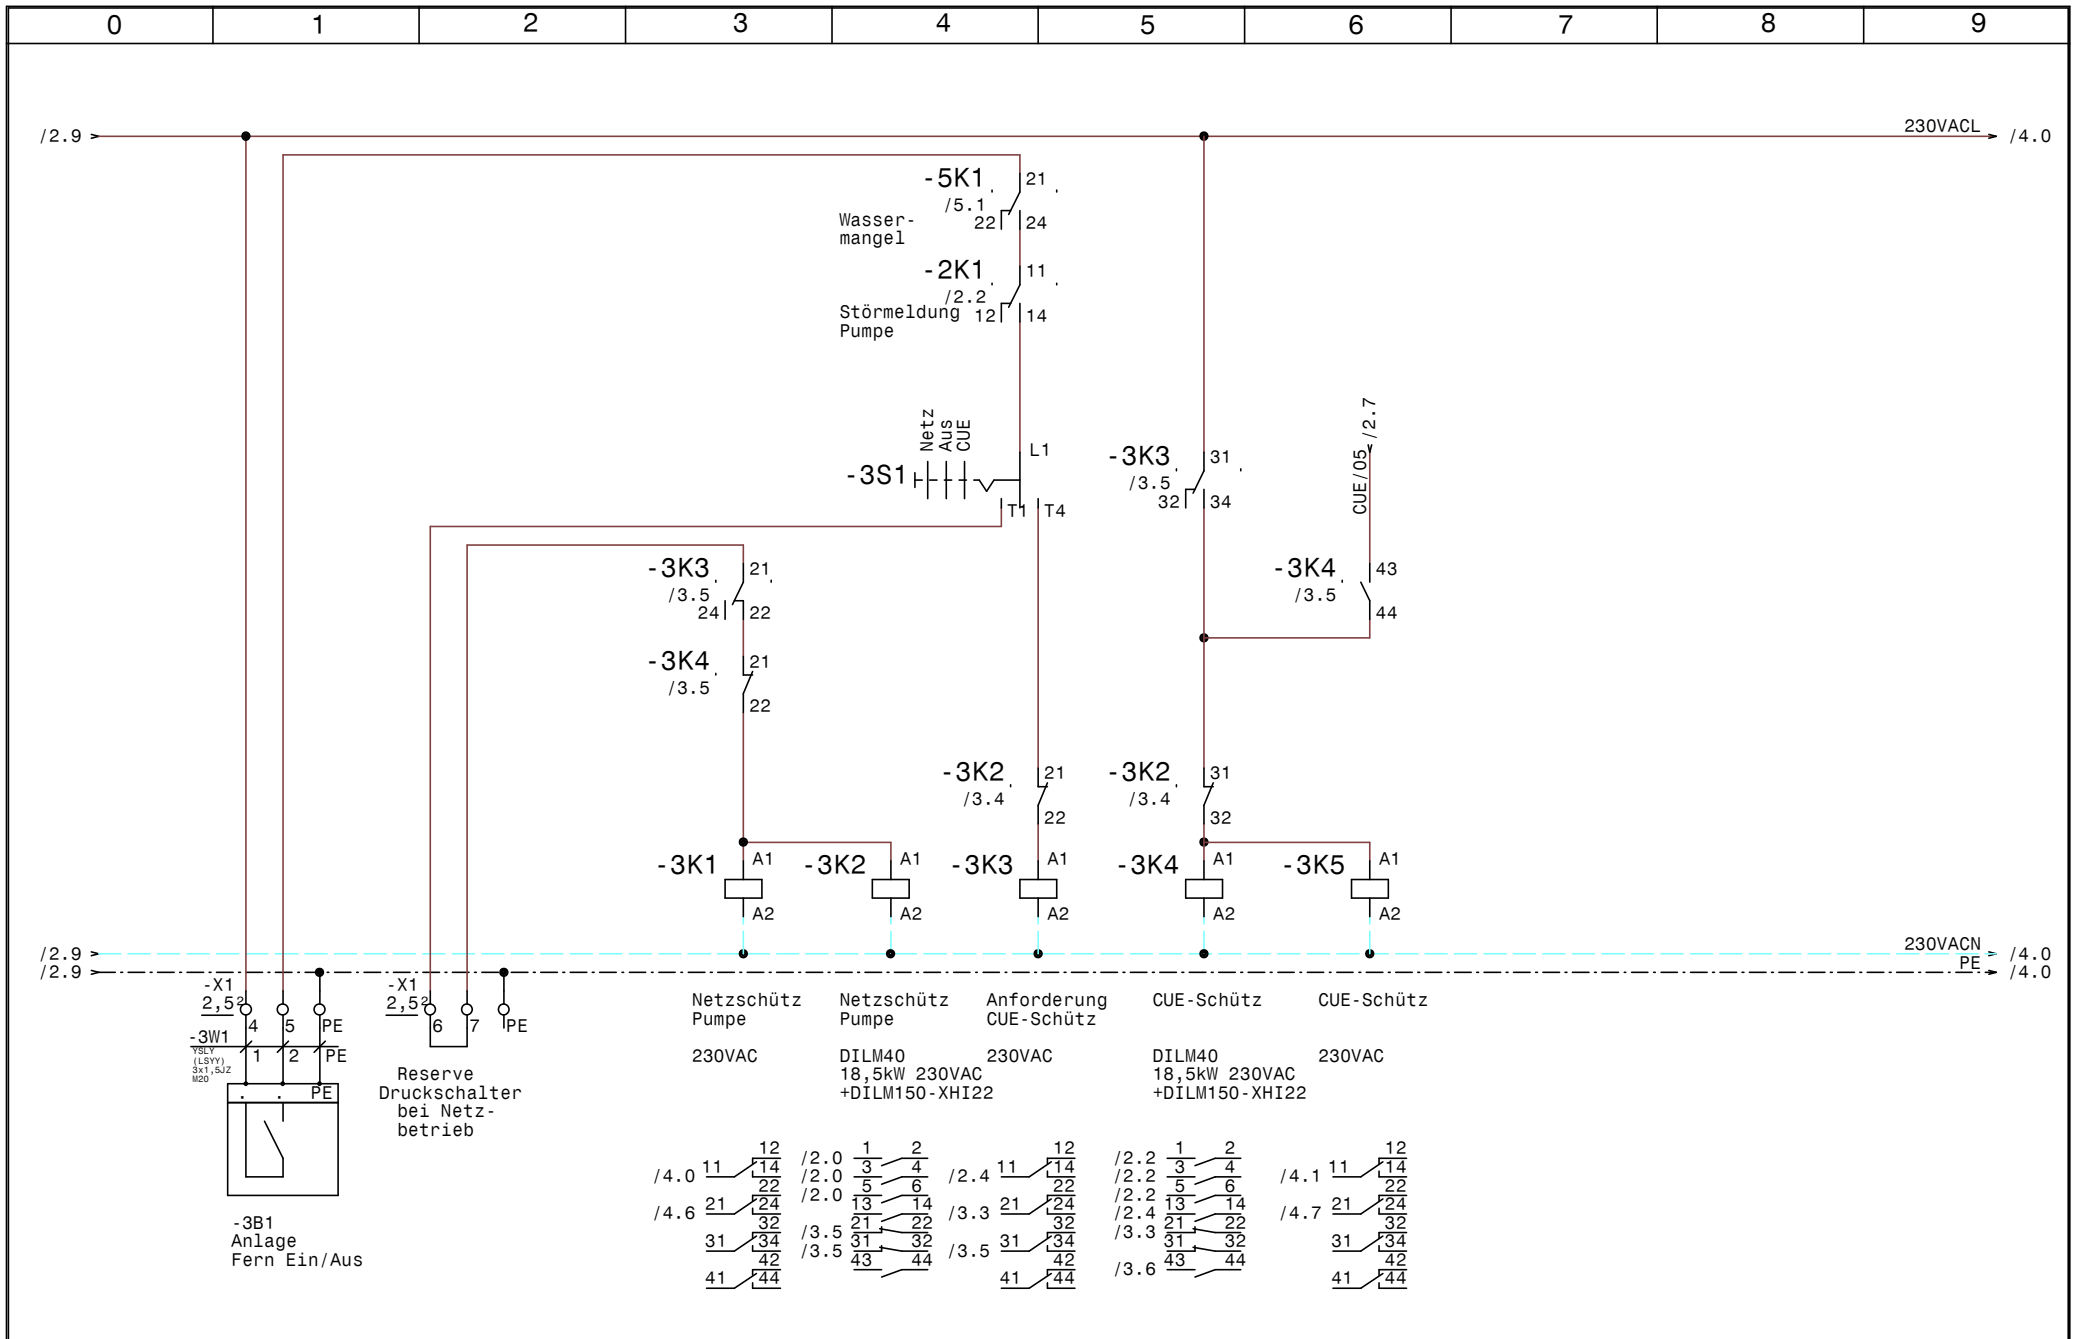







0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	RM4L			Nivauregelgerät		-5B1			
1	Neozed 3x20A			Neozed 3x20A		-1F1			
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F2			
1	NZMN1-M50			Leistungsschalter Motorschutz		-2F1			
1	M22-K10			Leistungsschalter Normalhilfskonta					
1	M22-K01			Leistungsschalter Normalhilfskonta					
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H2, -4H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H3, -4H4			
2	DILM40(230V50HZ)			Schütz		-3K2, -3K4			
2	DILM150-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
6	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K3, -5K1, -2K1, -2K2, -3K1, -3K5			
6	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				CUE32 22kW 44A 3x380-500V IP20		-2N1			
1				LC-Sinus Filter		-2N2			
1				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-2N3			
1				Thermostat		-1P1			
1	PN1-63			Hauptschalter		-1Q1			
1	M10HEU1			Umschalter 1pol. 1-0-2		-3S1			
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1			
1	M25			Kabelverschraubung		-2W1			
4	M20			Kabelverschraubung		-3W1, -4V1, -2W2, -5W1			
3	Klemme 16 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 16 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 16 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
21	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X1			
4	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1			
1	+NZM1 -XTVDVR			Türkuplungsdrehgriff für PN1		-1Z1			
1	+NZM1/2-XV4			Verlängerungsachse 400mm für PN1		-1Z2			

				Datum	25.07.14
				Bearb.	Hättinger F.
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Control CUE 1-DL18,5kW  
Aktivpark Montafon

Materialliste

Zeichn.Nr.:	
	249/14
	Blatt 1
	von 2 Bl.

