




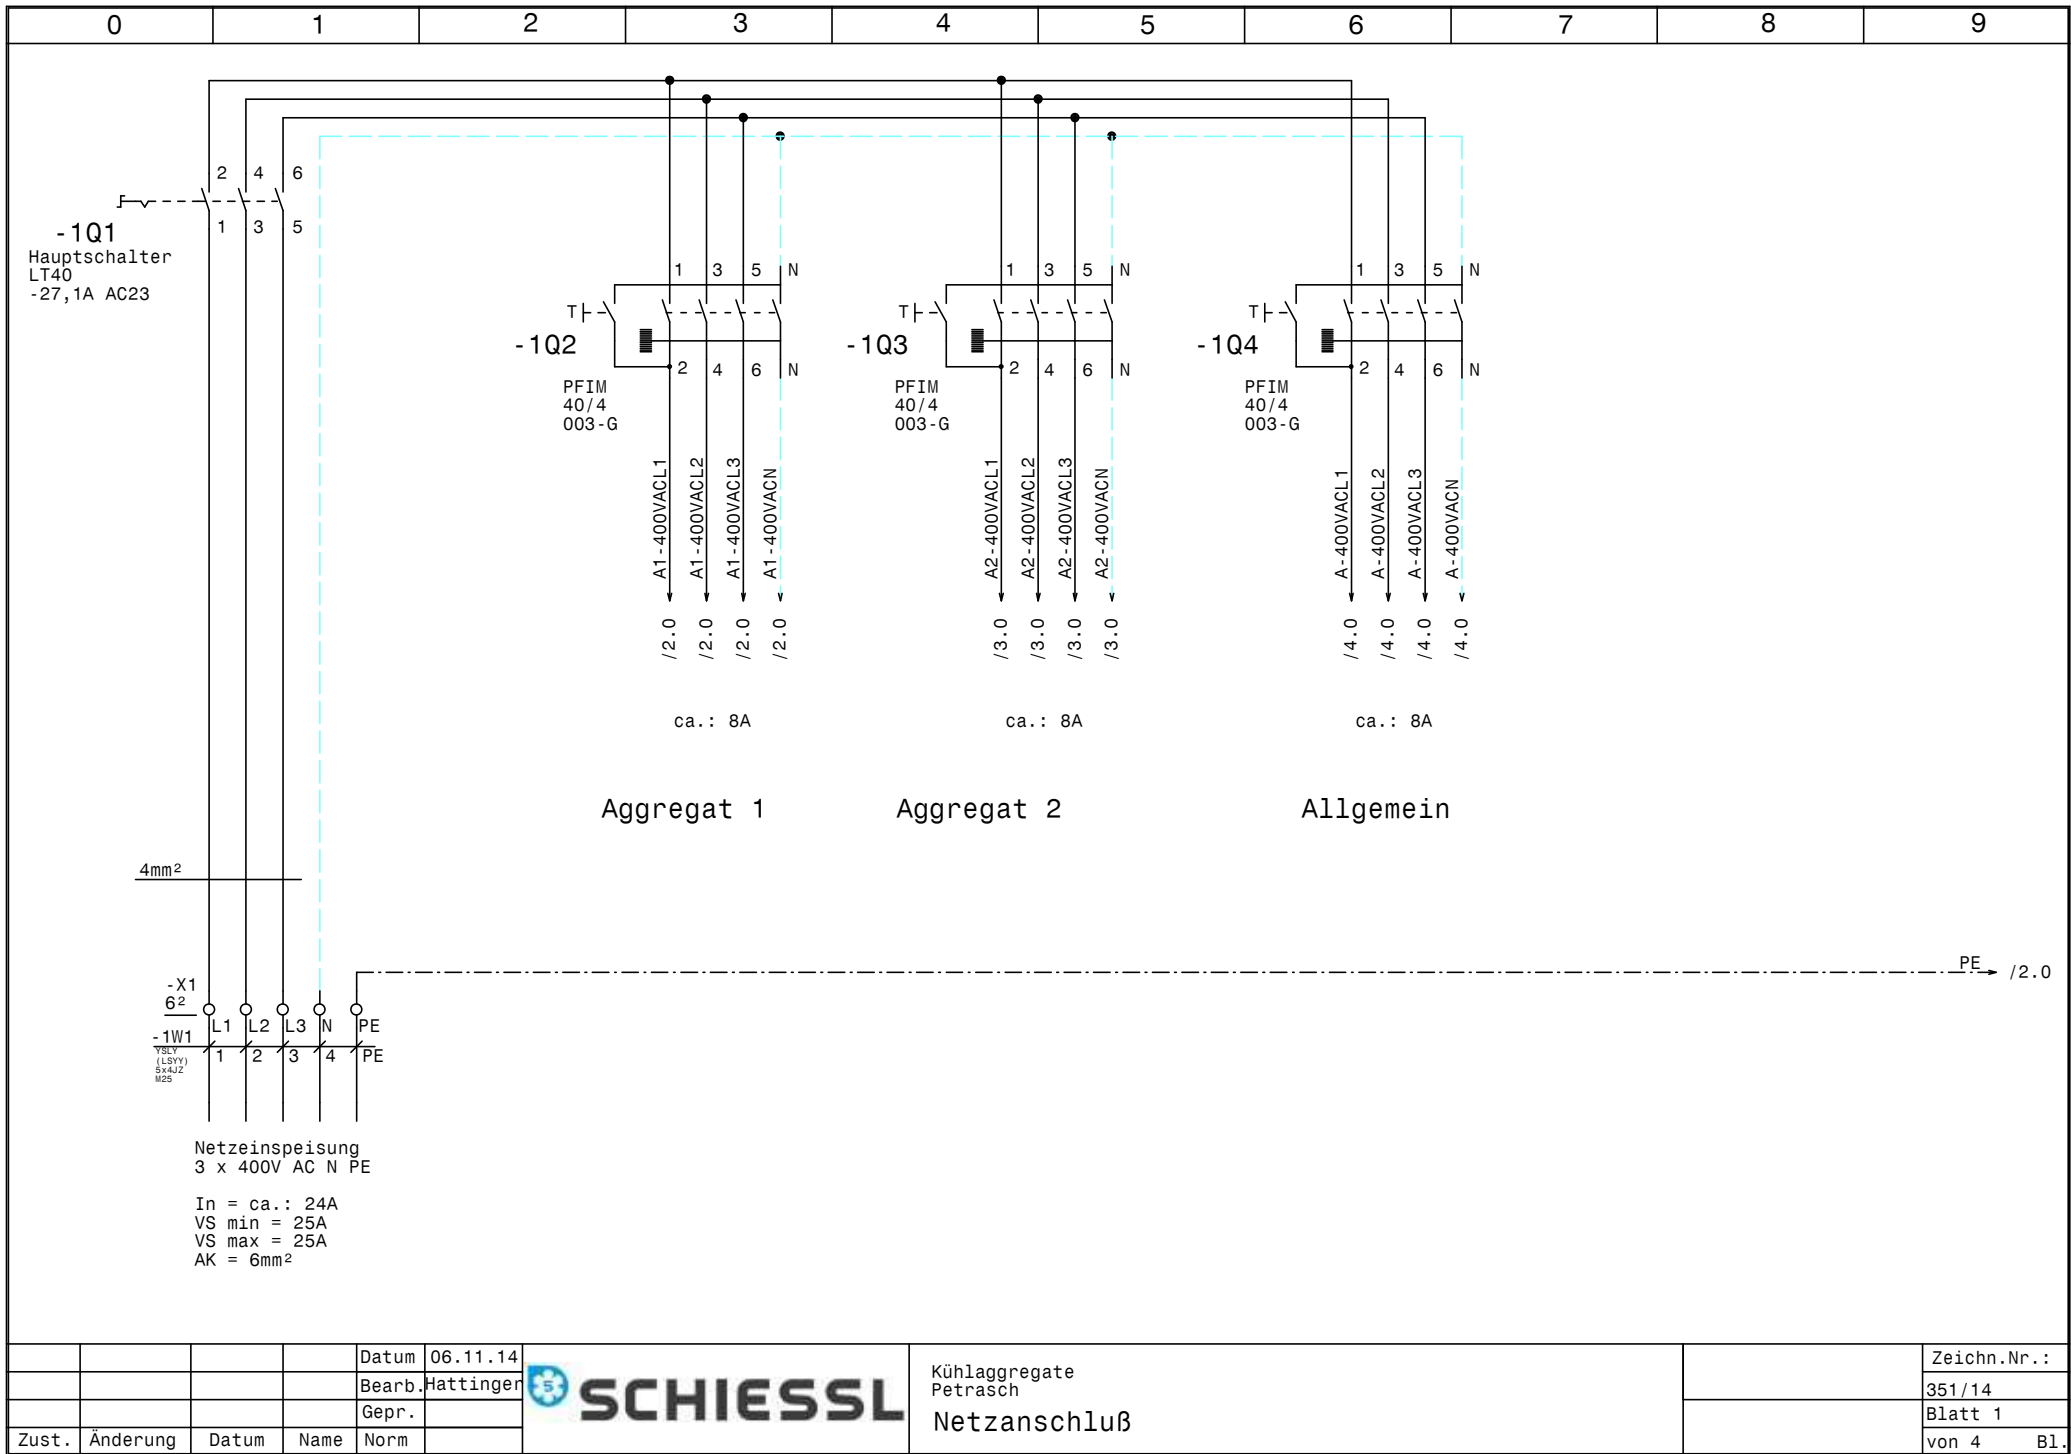

				Datum	06.11.14		Kühlaggregate Petrasch		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				351/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			Netzanschluß		von 4 Bl.

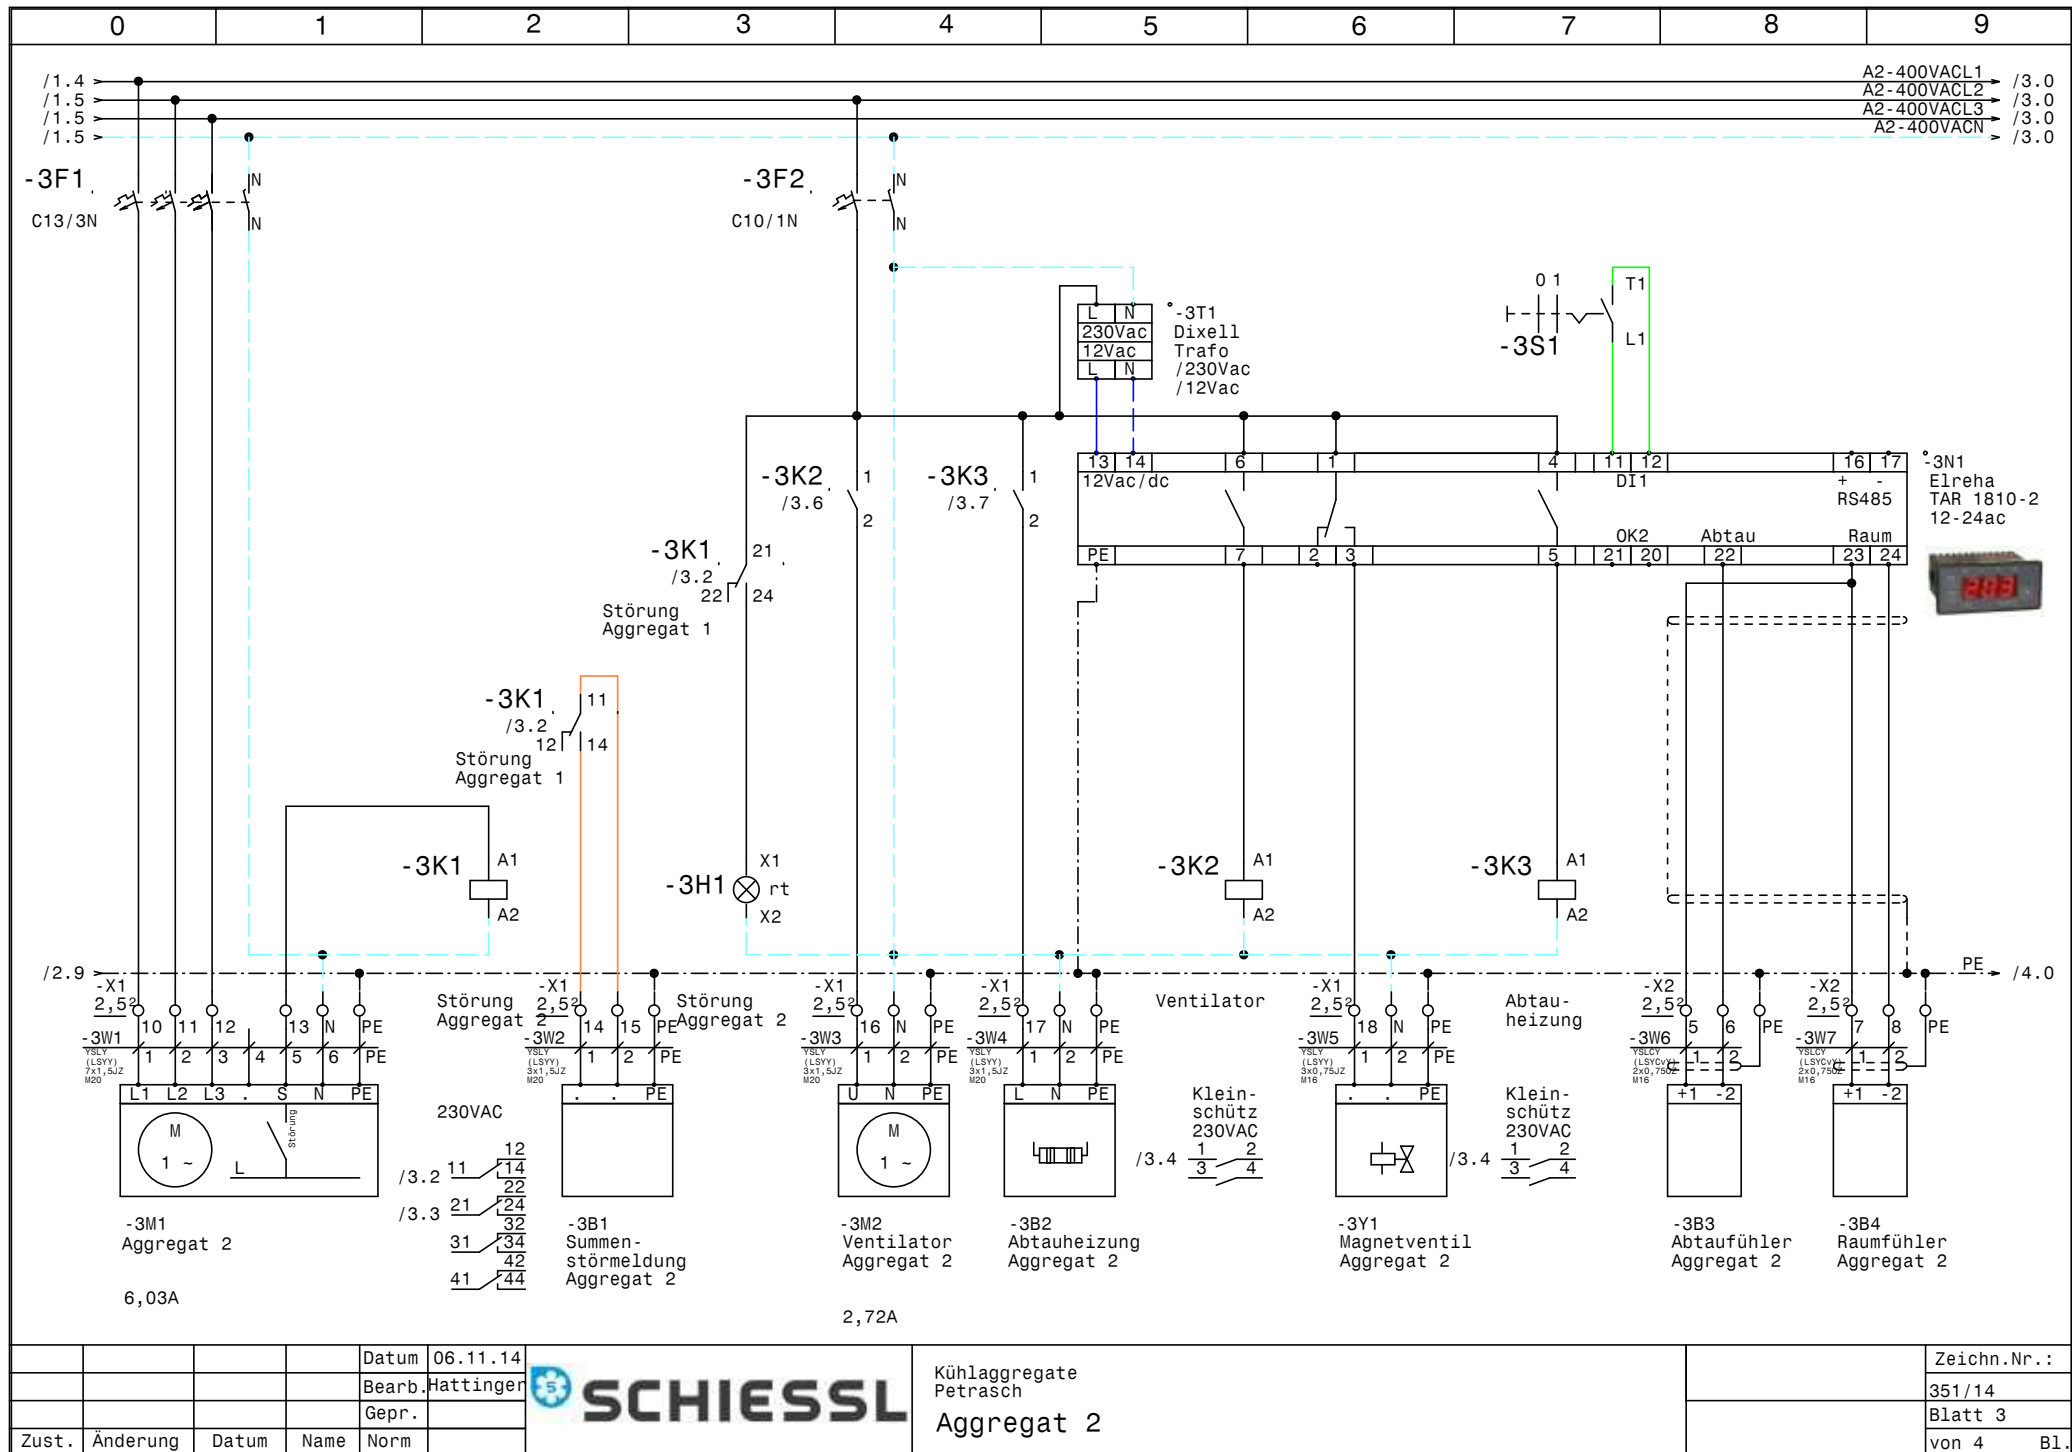

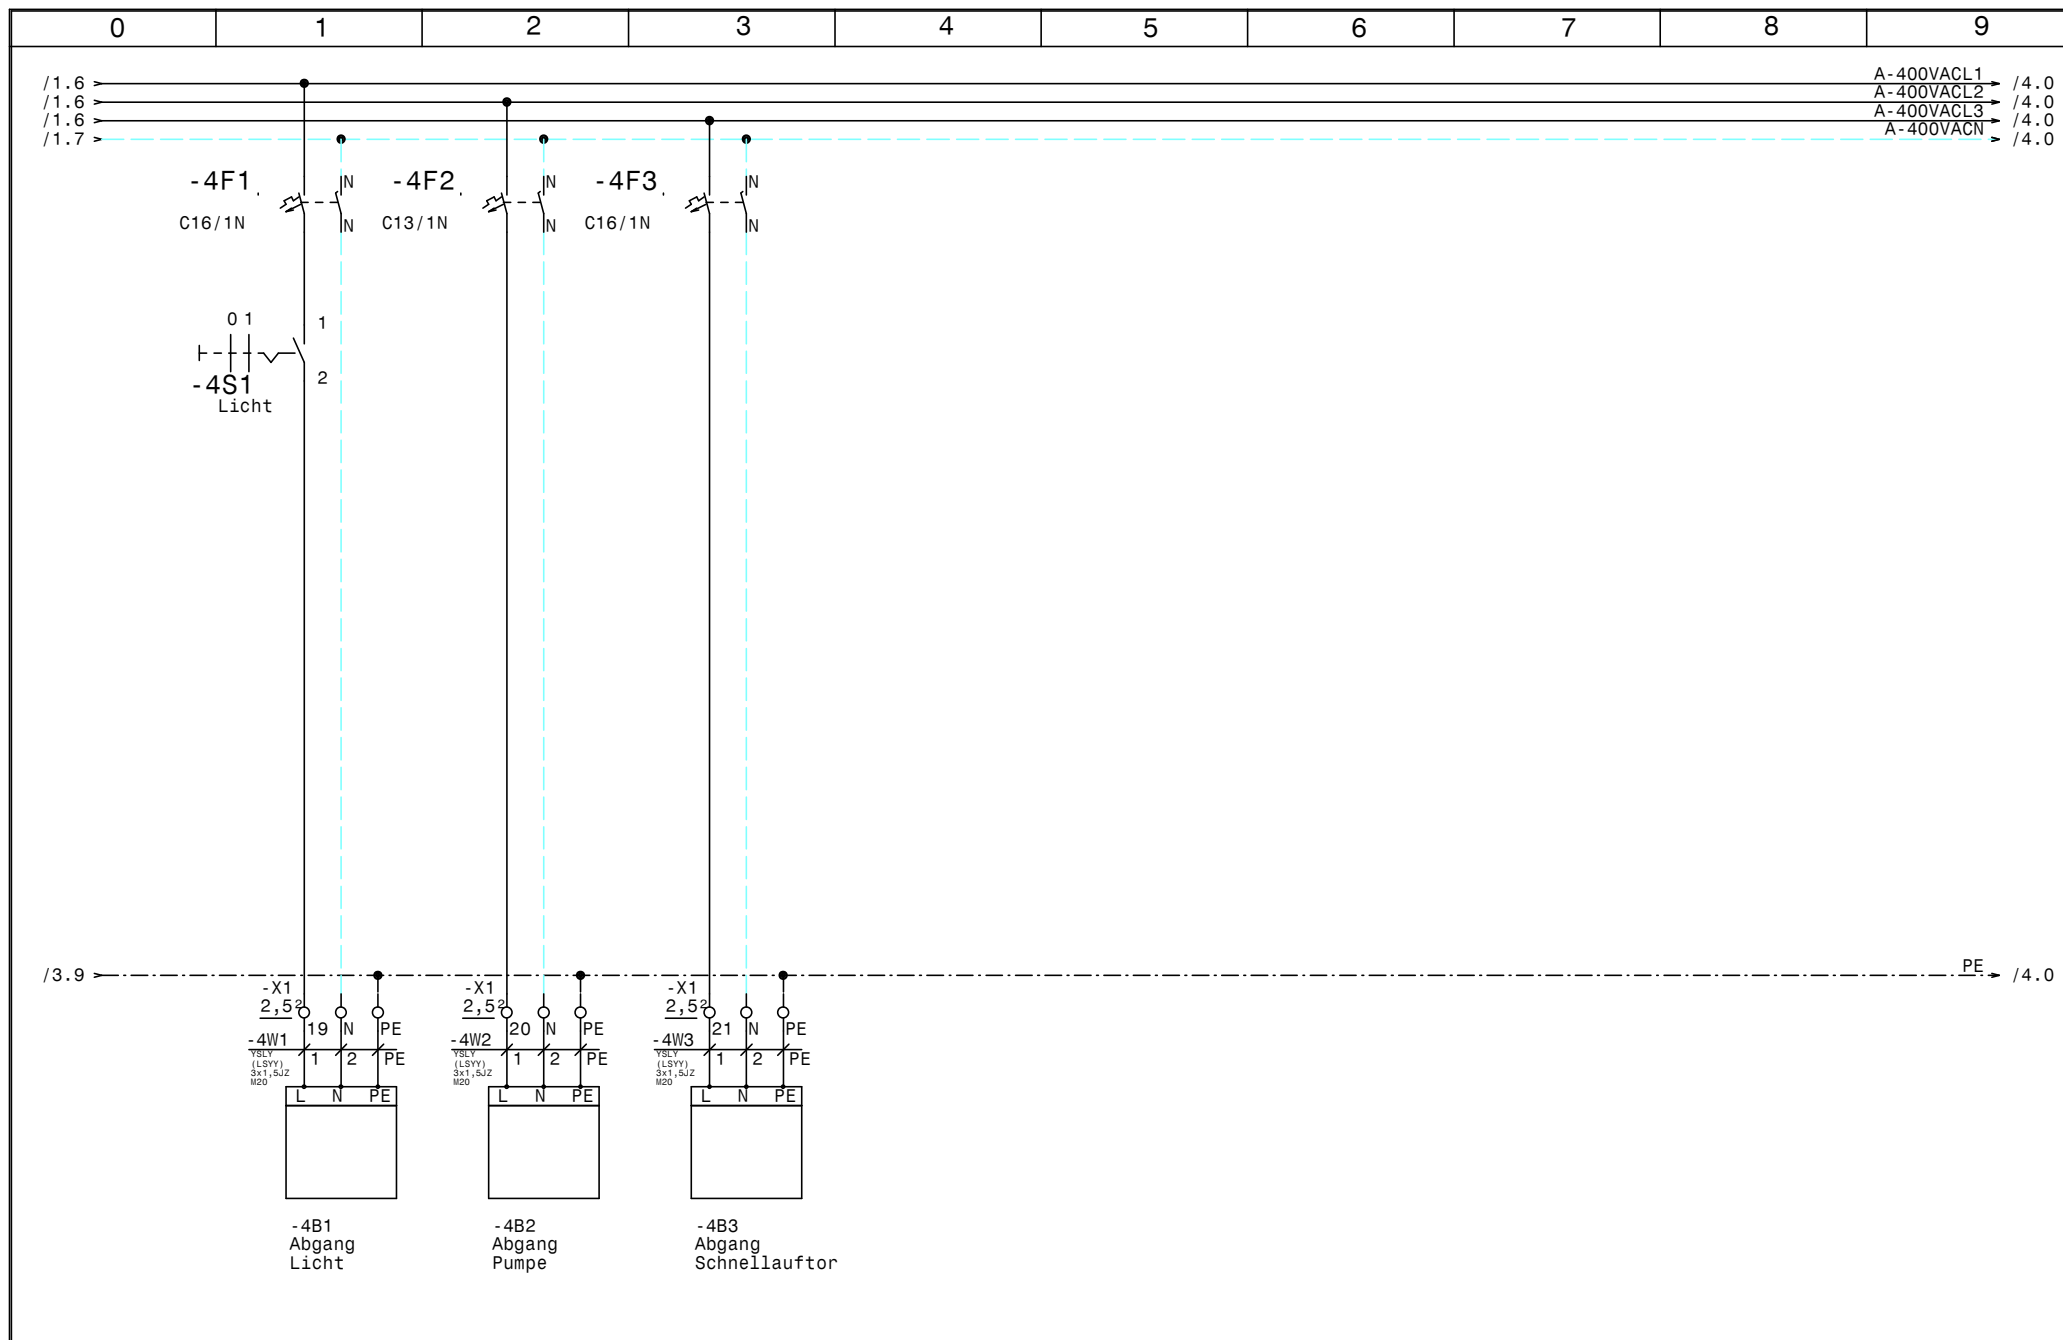

			Datum	06.11.14		Kühlaggregate Petrasch Abgänge Allgemein		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger				351/14
			Gepr.					Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Nr.		Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1		-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x4JZ M25				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2		-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 7x1,5JZ M20				7		Aggregat 1					
3		-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Summenstörmeldung Aggregat 1					
4		-2M2				-2W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Aggregat 1					
5		-2B2				-2W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abtauheizung Aggregat 1					
6		-2Y1				-2W5				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Aggregat 1					
7		-2B3				-2W6				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Aggregat 1					
8		-2B4				-2W7				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Aggregat 1					
9		-3M1				-3W1				YSLY (LSYY) 7x1,5JZ M20				7		Aggregat 2					
10		-3B1				-3W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Summenstörmeldung Aggregat 2					
11		-3M2				-3W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator Aggregat 2					
12		-3B2				-3W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abtauheizung Aggregat 2					
13		-3Y1				-3W5				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil Aggregat 2					
14		-3B3				-3W6				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler Aggregat 2					
15		-3B4				-3W7				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler Aggregat 2					
16		-4B1				-4W1				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Licht					
17		-4B2				-4W2				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Pumpe					
18		-4B3				-4W3				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Abgang Schnellaufator					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
2	C13/3N			Sicherungsautomaten		-2F1, -3F1			
2	C10/1N			Sicherungsautomaten		-3F2, -2F2			
2	C16/1N			Sicherungsautomaten		-4F1, -4F3			
1	C13/1N			Sicherungsautomaten		-4F2			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-3H1, -2H1			
2	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-2K1, -3K1			
2	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
4	BZ 326 437 /230VAC /2S			Kleinschütz für Wärmespeicher		-3K3, -3K2, -2K3, -2K2			
1	WS 6625 B=600 H=600 T=200			Wandschrank IP 55		-0N1			
2				Elreha TAR 1810-2 12-24ac		-3N1, -2N1			
1	LT40 -27,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
3	PFIM-40/4/003-G			Fehlerstromschutzschalter		-1Q4, -1Q3, -1Q2			
2	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1		-3S1, -2S1			
1				Ausschalter 1pol. 0-1		-4S1			
2				Dixell Trafo /230Vac /12Vac		-3T1, -2T1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
6	M16			Kabelverschraubung		-2W5, -3W5, -3W7, -3W6, -2W6, -2W7			
11	M20			Kabelverschraubung		-4W3, -4W2, -4W1, -3W4, -3W3, -2W3			
						-2W4, -3W2, -2W2, -2W1, -3W1			
17	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X2, -X1			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
11	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
29	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X1, -X2			
				Datum	06.11.14		Kühlaggregate Petrasch Materialliste		
				Bearb.	Hättinger F.				
				Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					Zeichn.Nr.: 351/14 Blatt 1 von 1 Bl.
